



Gradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani

28. 2. 2008

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>



Zakaj smo izvedli revizijo

- gre za projekt nacionalnega pomena, na katerega uresničitev čakamo že skoraj 20 let;
- do danes se gradnja še ni niti pričela, investicija pa bi morala biti zaključena že leta 1998;
- do zdaj so bila za celoten projekt porabljena že znatna proračunska sredstva.

Omejitve pri izvedbi revizije:

- časovna sledljivost projekta (1989 – 2007);
- obsežnost projekta, v povezavi s številnimi spremembami projekta;
- nedostopnost, pomanjkljivost dokumentacije, nezanesljivi viri podatkov;
- spreminjanje nosilca projekta in menjave oseb, ki so sodelovale pri projektu.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>




Mnenje računskega sodišča

Menimo, da ministrstvo **ne zagotavlja pogojev za uspešno in učinkovito izvedbo projekta gradnje UKL/NUK II**, kar ne daje zadostnih zagotovil, da bo stavba leta 2011 tudi končana.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

O reviziji

- cilj revizije: Kako poteka gradnja UKL/NUK II?
- nosilec projekta: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- revidirano obdobje: 2006 in 2007



Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Dokumentacija

Ali ministrstvo razpolaga s popolno dokumentacijo o izvajanju projekta UKL?

Ugotovili smo:

- dokumentacija ni v celoti zbrana in hranjena ter urejena na način, ki bi omogočal transparenten časovni in vsebinski pregled;
- dosedanjega poteka aktivnosti ni mogoče kronološko in vsebinsko natančno opisati;
- stanje ni v celoti zadovoljivo.

Tveganje: dokumentacija projekta ne bo nikoli popolna.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>



Kadri

Ali stanje na področju kadrovske-organizacijske strukture omogoča kakovostno izvajanje UKL/NUK II?

Ugotovili smo:

- obstoječa kadrovske-organizacijska struktura projekta je pomanjkljiva in neustrezna;
- na ministrstvu se s tem projektom pretežno ukvarja le ena oseba;
- nejasne vloge in pristojnosti dveh posvetovalnih teles: gradbeni odbor in projektna skupina.

Tveganje: neučinkovito vodenje, ki lahko ogrozi dokončanje 1. faze gradnje do leta 2011.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Načrtovanje

Kako ministrstvo načrtuje gradnjo UKL/NUK II?

Ugotovili smo:

- med izvajanjem revizije natančen terminski načrt 1. faze UKL/NUK II ni obstajal;
- terminski načrt 2. in 3. faze UKL/NUK II ni obstajal;
- stanje ni omogočalo uspešne, učinkovite izvedbe UKL/NUK II;
- ministrstvo je naknadno predložilo terminski načrt za 1. fazo UKL/NUK II;
- ministrstvo nima ocene tveganj za izvedbo UKL/NUK II.

Tveganje: vsebinska in časovna izvedljivost UKL/NUK II.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>


Dosedanje financiranje

Ugotovili smo:

- do konca leta 2007 je bilo za projekt UKL porabljenih že **vsaj 29,3 milijona evrov** (7 milijard tolarjev)

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Dosedanje financiranje

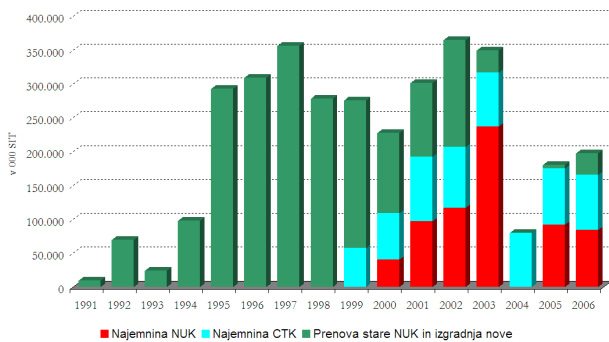

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Načrtovano financiranje

Kako je načrtovano prihodnje financiranje UKL/NUK II?


Ugotovili smo:

- med izvajanjem revizije ministrstvo ni imelo natančnega finančnega načrta UKL/NUK II;
- finančna sredstva so sicer predvidena v proračunih, vendar na nepregleden način;
- načrtovanje ni bilo ustrezno;
- ministrstvo je naknadno predložilo natančnejšo strukturo financiranja 1. faze UKL/NUK II.

Strošek do dokončane 1. faze UKL/NUK II:
vsaj 2,3 mio EUR/leto (najemnine CTK, NUK)

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Načrtovano financiranje

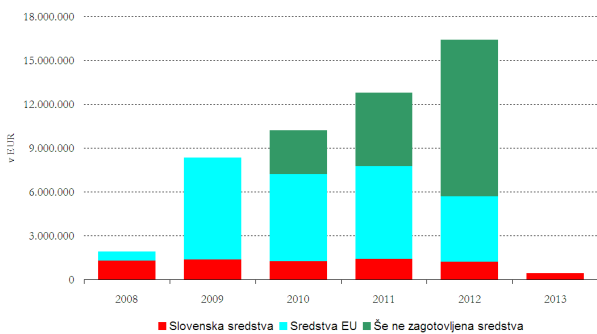

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Lokacija



Ali je ministrstvo zagotovilo lokacijo za UKL/NUK II?

Ugotovili smo:

- ministrstvo še ne razpolaga z vsemi potrebnimi nepremičninami za pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje;
- tveganje predstavlja tudi pridobivanje soglasij;
- stanje na nepremičninah ni zadovoljivo.


Tveganje: dodaten časovni odmik pričetka same gradnje.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>

Lokacija



Zadnja idejna zasnova

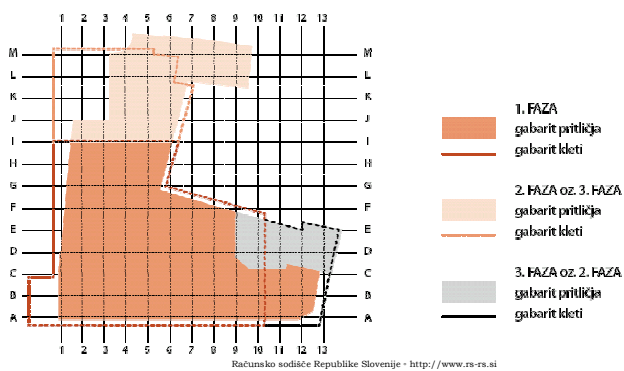


Nadaljnji ukrepi

- Računsko sodišče je ministrstvu naložilo:
- pripravo ocene tveganj
 - dopolnjen terminski načrt za 1. fazo in
 - terminski načrt za 2. in 3. fazo projekta UKL/NUK II.

Rok za pripravo odzivnega poročila: 90 dni.

Računsko sodišče Republike Slovenije - <http://www.rs-rs.si>



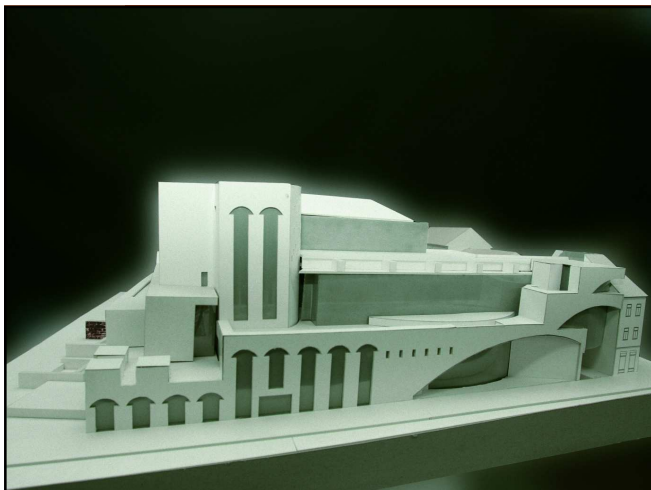

Hvala za pozornost!

Poročilo je dostopno na naslovu:
<http://www.rs-rs.si>

E-naslov za vprašanja:
sloaud@rs-rs.si

A photograph of a residential area. In the foreground, there is a sign that reads "NUKOS-KDAJ?" and "Ta art avto razstavlja na tvoj premoženje. Morda boš imel #pogost vrtarji." The background shows several multi-story residential buildings and some greenery.
