



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO

Nova sodna stavba v Ljubljani

Revizija smotrnosti poslovanja

Revizijsko obdobje: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2020



Nova sodna stavba v Ljubljani je že 15 let eden od neuresničenih državnih projektov



Sodstvo je ena od treh vej oblasti, ki skrbijo za pravni red v državi.

Izgradnja objekta bi rešila prostorsko problematiko prvostopenjskih pravosodnih organov, ki delujejo razpršeno na kar **19** lokacijah v Ljubljani.



Poslovni prostori okrajnega, okrožnega ter delovnega in socialnega sodišča so večinoma v najemu.


Vrhovno in višje sodišče
Tavčarjeva ulica 9



Projekt nove sodne stavbe v Ljubljani v fazi načrtovanja – MASARYKOVA

Ocenjena vrednost investicije v letu 2006

75.000.000 €

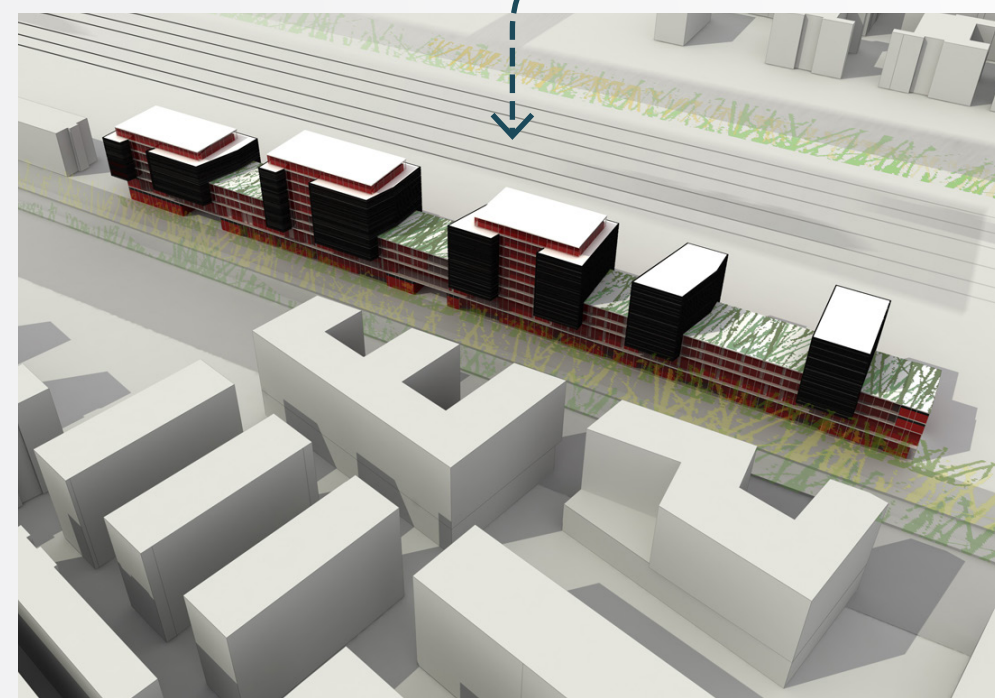

Maketa nove sodne stavbe
Masarykova



Masarykova 2021
parkirišče




Zavrnjena vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja.



Projekt nove sodne stavbe
v Ljubljani **ustavljen**.

Varianta izvedbe investicije na Masarykovi
ocenjena kot najmanj ugodna.



Projekt Masarykova je bil **po 7 letih**
ustavljen, čeprav je bilo zanj
porabljenih več kot 7 milijonov €.
Glede na načrte **bi moral biti zaključen**.

Projekt nove sodne stavbe v Ljubljani še vedno v fazi načrtovanja – BEŽIGRAJSKI DVOR

Ocenjena vrednost investicije v letu 2019

95.081.460 € ↗

2013 2017 2021

študija preveritve
prostorsko-programске
postavitve objekta

13.274 €

2. predviden
zaključek projekta

Zaključek projekta ponovno premaknjen !

DIIP
5x


PIZ
1x

NIP
1x

Ministrstvo za pravosodje je od leta 2006 večkrat potrdilo investicijsko dokumentacijo, ki pa **ni ustrezna podlaga za realizacijo investicije.**

2027


3. predviden
zaključek projekta

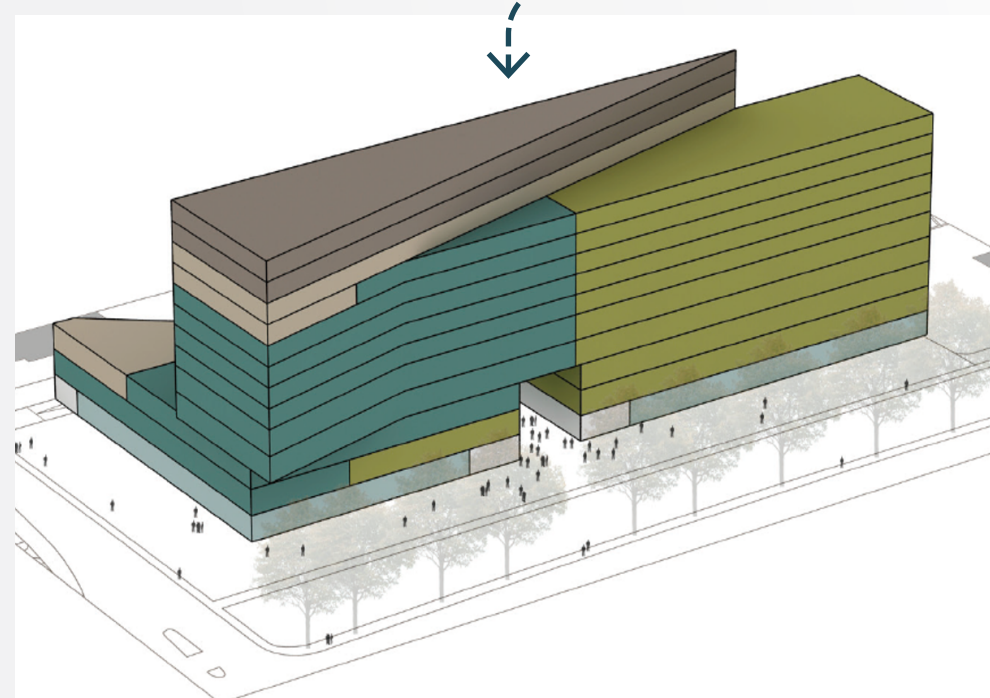

Prostorski prikaz nove sodne stavbe
Bežigradski dvor



Bežigradski dvor 2021
gradbena jama




Projekt Bežigradski dvor je še vedno v fazi načrtovanja. Investicijski program, ki predstavlja strokovno podlago za odločitev o izvedbi investicije, **še ni potrjen.**



Ministrstvo v celotnem obdobju trajanja projekta **ni imelo zagotovljenih finančnih sredstev v državnem proračunu** za izvedbo projekta in tudi **ni uspelo zagotoviti sredstev EU**.



Izkazane **prostorske potrebe pravosodnih organov so večje od načrtovanih zmoglosti umestitve prostorov** v novo sodno stavbo na aktualni lokaciji ob Dunajski cesti.




Ministrstvo je šele v letu 2019 zbralo kadrovske podatke pravosodnih organov, ki naj bi v novi sodni stavbi imeli svoje prostore.




Pri oblikovanju prostorskih potreb ministrstvo **ni upoštevalo specifične narave dela** pravosodnih organov.

MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA



Poslovanje **Ministrstva za pravosodje** pri realizaciji projekta nove sodne stavbe v Ljubljani je bilo **neučinkovito**.

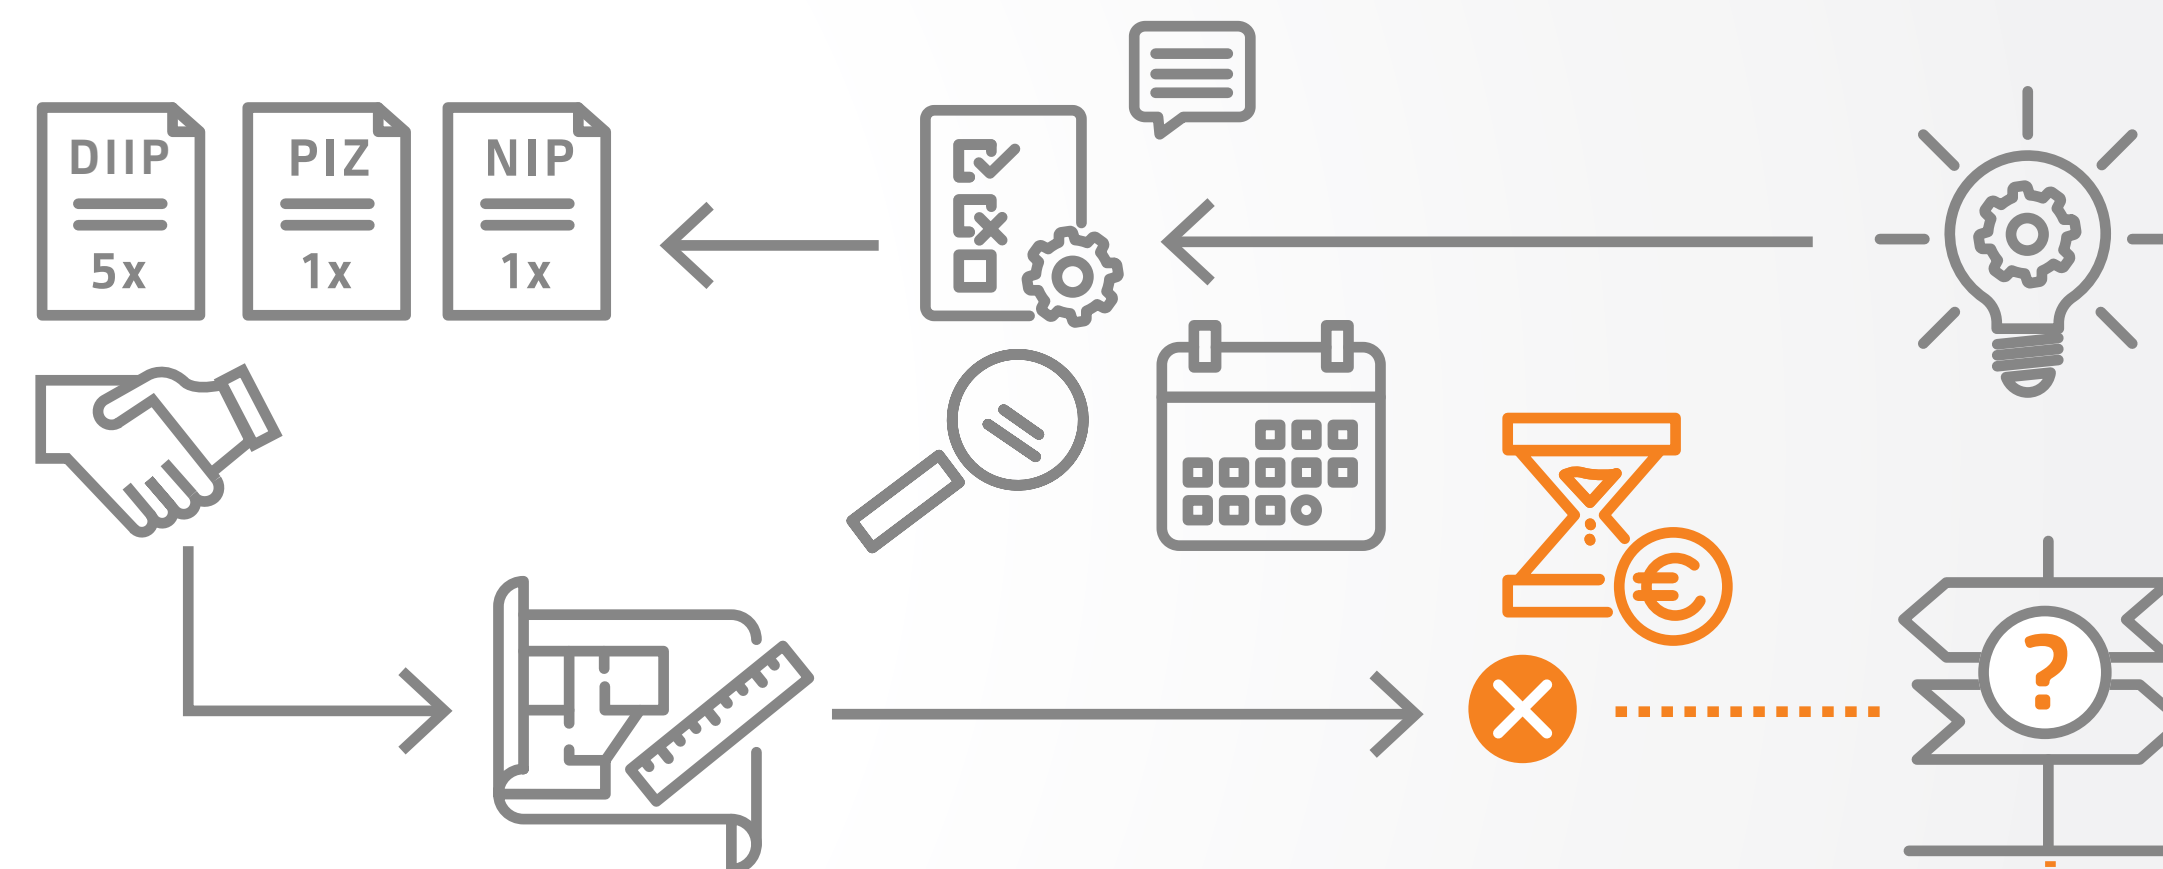

POPRAVLJALNI UKREP

Računsko sodišče je od Ministrstva za pravosodje **zahtevalo** izvedbo popravljalnega ukrepa, **s katerim bi se projekt** iz večletnega obdobja načrtovanja lahko **premaknil v fazo izvedbe**.

