



Uspešnost reševanja prostorske problematike slovenskih zaporov


Novinarska konferenca, 26. 7. 2012



- **Revidiranca:** Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvo za pravosodje (zdaj Ministrstvo za pravosodje in javno upravo)
- **Cilj revizije:** izrek mnenja o uspešnosti reševanja prostorske problematike zaporov v Republiki Sloveniji od 1. 1. 2006 do 10. 2. 2012

Ugotovitve - splošno

- Število zaprtih oseb se povečuje

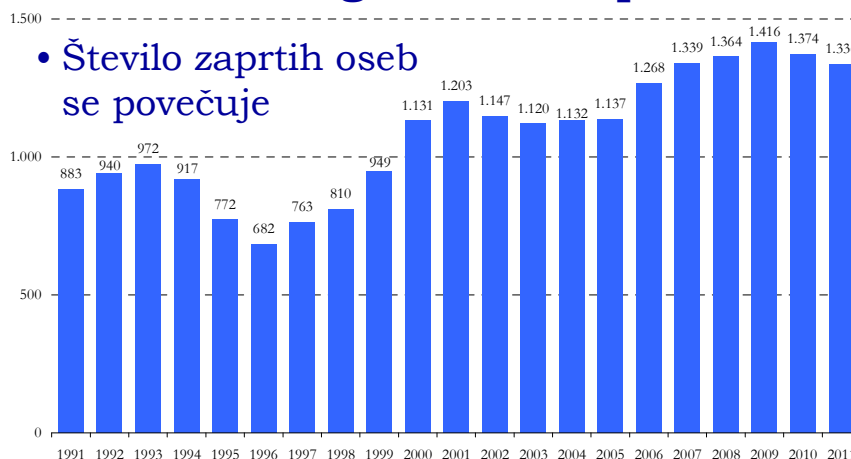

- Zapori so že vrsto let prenapolnjeni

Računsko sodišče Republike Slovenije • <http://www.rs-rs.si>

Ugotovitve - splošno

- **Ni ustreznega strateškega načrta** za rešitev prenapolnjenosti zaporov (zadnji iz leta 2005 oziroma 2006)
- **Cilji** na področju investicij v nove kapacitete **niso bili doseženi**, saj se razen izgradnje dveh novih objektov na Dobu ostale načrtovane investicije še niso niti pričele izvajati

Računsko sodišče Republike Slovenije • <http://www.rs-rs.si>

Ugotovitve - Dob

Uprava projekta prenove in dozidave zapora na Dobu **ni ustrezno načrtovala in izvajala**, saj:

- je večkrat spremenila projektno nalogo, kar je vplivalo na povečanje skupne pogodbene vrednosti sredstev za pripravo projektne dokumentacije za 107 odstotkov na skoraj 1,6 milijona evrov;
- se je prvotna ocena potrebnih finančnih sredstev v okviru nacionalnih razvojnih programov med izvajanjem projekta, predvsem na račun povečanja načrtovanih kapacitet, s 6,1 milijona evrov na predlog uprave povečala na 86,7 milijona evrov;
- kljub večkratnemu zmanjšanju načrtovanih sredstev za investicije v letih 2006, 2007, 2008, 2009 in 2011 razpoložljivih sredstev dejansko ni v celoti namenila za investicije;
- se je izgradnja dveh novih objektov na Dobu zaradi sprememb lastnosti projekta in težav s projektno dokumentacijo namesto v pogodbeno določenih 12 mesecih končala šele po 25 mesecih.

Ugotovitve - stanje

Razmere v zaporih niso bile v celoti v skladu z zahtevami oziroma priporočili predpisov, kot na primer:

- preveliko število zaprtih oseb v posameznih sobah (npr. več kot osem obsojencev na sobo),
- neobstoj zahtevanih prostorov (npr. prostorov za letni dopust obsojencev),
- ni predvidenih ločitev posameznih kategorij zaprtih oseb (npr. povratniki med priporniki).

Zapori so bili ob zaključku revizije, kljub povečanju skupnih uradnih kapacitet vseh zaporov za 189 postelj, **še vedno prenapolnjeni**.




Mnenje – reševanje prostorske problematike

- Računsko sodišče je izreklo mnenje, da **uprava ni bila uspešna** pri reševanju prostorske problematike zaporov.
- Tudi **ministrstvo ni bilo uspešno** pri reševanju prostorske problematike zaporov, saj ni ustrezno sodelovalo pri načrtovanju investicij za rešitev prostorske problematike slovenskih zaporov in ni ustrezno nadziralo uprave pri izvajanju projekta prenove in dozidave zapora na Dobu ter pri doseganju zastavljenih ciljev na področju investicij v zapore, s katerimi bi se zmanjšala prenapolnjenost v zaporih.

Računsko sodišče Republike Slovenije • <http://www.rs-rs.si>

Mnenje – spopad s posledicami prenapolnjenosti

- Uprava **je** ustrezno in v zadostni meri uporabljala ukrepe za zmanjševanje prenapolnjenosti zaporov, ki so v njeni pristojnosti,
- Ministrstvo **je** bilo uspešno pri zagotavljanju pravnih podlag, ki so širile nabor ukrepov za zmanjševanje prenapolnjenosti in s tem vplivale na zmanjševanje posledic prenapolnjenosti zaporov.

Zahteva

Uprava mora v 90 dneh

- proučiti možnosti za **uveljavljanje odgovornosti projektanta** zaradi domnevno nestrokovnega dela pri pripravi projektne dokumentacije in sprejela odločitev o pričetku postopka povračila stroškov, ki so zaradi tega nastali (projekt Dob);
- po skrbni izmeri velikosti bivalnih sob v vseh zaporih v Republiki Sloveniji **ponovno določiti uradno kapaciteto vseh zaporov** in pri tem v vseh zaporih uporabiti enak normativ za primerno površino na zaprto osebo (neenaka uporaba normativov).

Priporočila

Računsko sodišče je revidirancema podalo več priporočil, med njimi tudi glede **vodenja in nadzora prihodnjih investicij** (predvsem pri nadaljevanju projekta na Dobu in novogradnje v Ljubljani) in **proučitve možnosti dodatnega spodbujanja alternativ priporu in kazni zapora.**

Računsko sodišče Republike Slovenije • <http://www.rs-rs.si>

Hvala za pozornost

Revizijsko poročilo je dosegljivo na spletni strani:
www.rs-rs.si



Revizijsko poročilo

Uspešnost reševanja prostorske problematike slovenskih zaporov

Računsko sodišče Republike Slovenije • <http://www.rs-rs.si>
