




REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

REVIZIJSKO POROČILO

Vzpostavitev enotnega transfuzijskega informacijskega sistema

Revizija smotrnosti poslovanja

Revidirano obdobje: 1. 1. 2009 do 30. 4. 2016

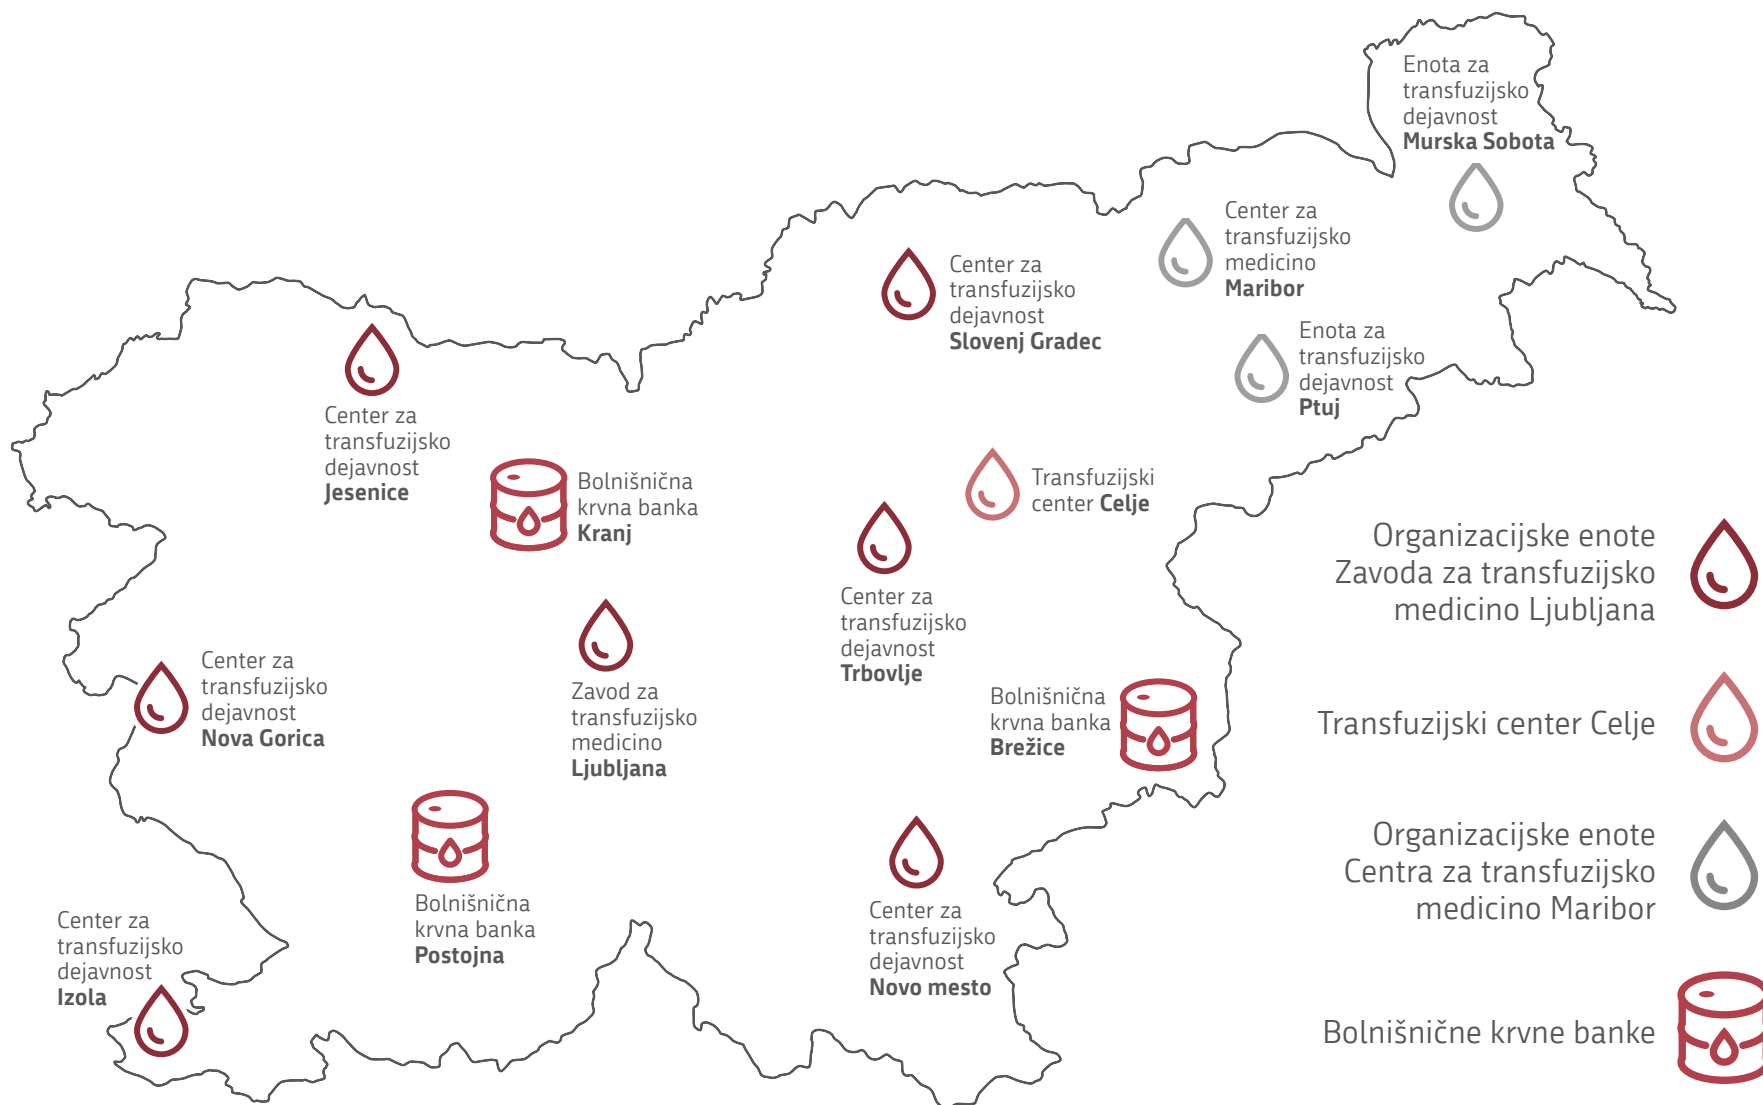





70.000
krvodajalcev
letno




100.000
enot krvnih
produktov letno



5.000
različnih
terapevtskih
storitev



310.000
različnih testiranj
za paciente in
zunanje naročnike



Zavod naj bi na podlagi Zakona o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1) **vodil enoten transfuzijski informacijski sistem**

OBSTOJEČI SISTEM

- ➖ Ni optimalen z vidika **informacijske varnosti**
- ➖ Zahteva **veliko pretipkavanja podatkov** in ročnega dela
- ➖ Zahteva **veliko ročnih kontrol** za zagotavljanje **varnosti pacientov**
- ➖ **Omejene možnosti izmenjave podatkov** z drugimi informacijskimi sistemi in z medicinskimi napravami
- ➖ **Ne podpira vseh področij** dela zavoda

1990

uveden obstoječi transfuzijski informacijski sistem



2000

zadnja večja nadgradnja obstoječega sistema

2006

sprejet ZPKrv-1, ki predvideva obstoj informacijskega sistema

2011

javno naročilo **uspešno zaključeno**

2017

vzpostavitev sistema še ni končana

1990

1995

2000

2005

2010

2015


Javno naročilo in vzpostavitev novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema

JAVNO NAROČILO

- ✓ **Podrobne in pregledne funkcionalne in tehnične zahteve**
- ✓ Pogodba, ki je kar najbolj **zaščitila interese zavoda**
- ✓ **Ekonomsko najugodnejša ponudba** za vzpostavitev in petletno vzdrževanje novega enotnega transfuzijskega informacijskega sistema v vrednosti **1.449.500 €**



Zavod je bil **pri pridobivanju** novega informacijskega sistema **učinkovit**



VZPOSTAVITEV SISTEMA

- ✖ **Izbrana rešitev** je bila vsebinsko deloma različna od ponudbe – **ni podpirala dela laboratorijev**
- ✖ Zavod **ni upošteval** nekaterih **dobrih praks** projektnega vodenja
- ✖ **Uvedba pri drugih** deležnikih področja preskrbe s krvjo **ni bila jasna**
- ✓ Zavod je **izplačal le 7 %** pogodbene vrednosti rešitve in **je imel celovit nadzor nad stroški**



Kljub temu zavod **pri izvajanju projekta vzpostavitve** novega informacijskega sistema **ni bil uspešen**
