



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

Revizijsko poročilo o učinkovitosti uporabe evropskih sredstev za zaščito pred poplavami

v obdobju od začetka leta 2007 do marca leta 2014


Revidiranci: ministrstvo, pristojno za okolje (MOP in MKO), in agencija za okolje (ARSO)

Ljubljana, 12. november 2014

RS
RS



Koriščenje evropskih sredstev programskega obdobja 2007–2013

- od leta 2007 na razpolago 74,2 milijona evrov evropskih sredstev za povečanje poplavne varnosti, sredstva so na voljo do konca leta 2015;
- prvi projekt je bil odobren za izvajanje leta 2010 (BOBER – spremljanje in analiziranje vodnega okolja), drugi leta 2012 (lokalni ukrepi na porečju Savinje) in tretji v letu 2013 (lokalni ukrepi na porečju Drave);
- do konca leta 2013, to je sedem let po začetku programskega obdobja, je država porabila 23,2 milijona evrov evropskih sredstev;

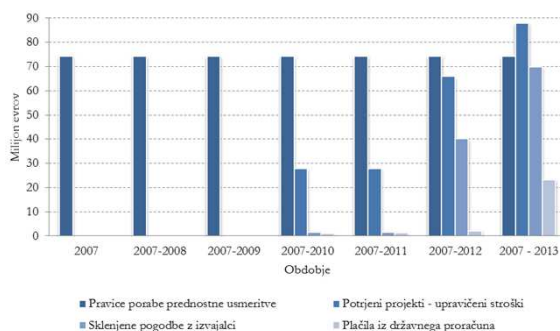

www.rs-rs.si

2

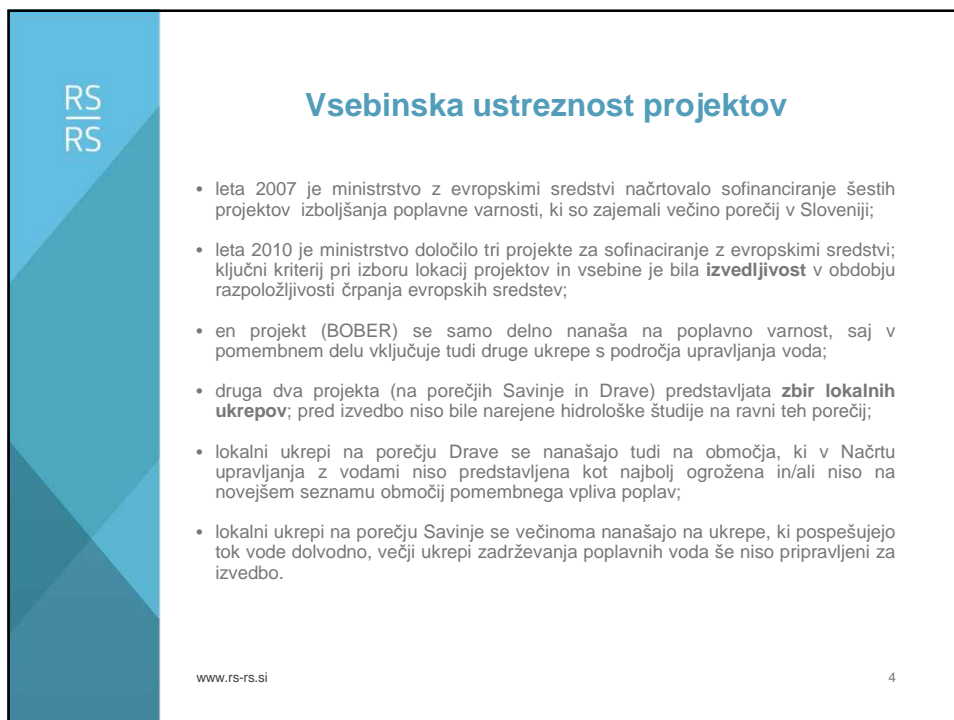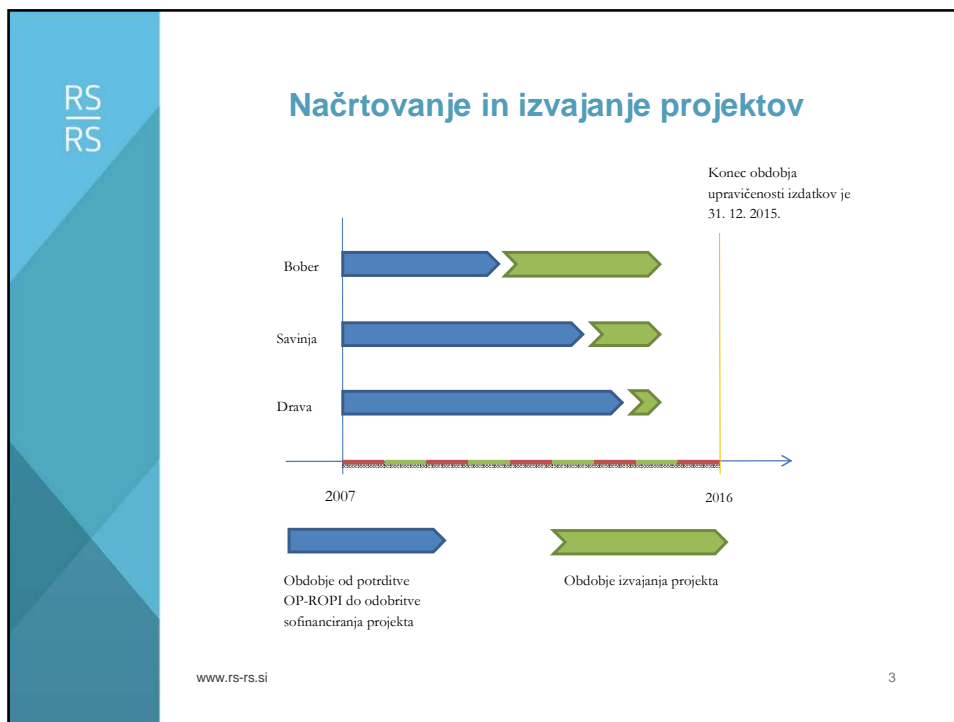

RS
RS

Pripravljenost na novo programsko obdobje 2014–2020

- sprejeta sta nova državna prostorska načrta za urejanje poplavne varnosti za območji Železnikov in dela jugozahoda Ljubljane;
- ministristvo je določilo 61 območij pomembnega vpliva poplav;
- na ravni države še ni razdelano, na katerih območjih pomembnega vpliva poplav in s katerimi ukrepi bomo dosegli največje učinke na zmanjšanje poplavne ogroženosti;
- podrobnejše karte poplavne nevarnosti in Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti so še v fazi izdelave;
- stopnja pripravljenosti projektov, ki bi lahko bili sofinancirani z evropskimi sredstvi v programskem obdobju 2014–2020, ni bistveno višja, kot je bilo stanje z obstoječimi projekti leta 2007.

www.rs-rs.si 5

RS
RS

Sredstva drugih ukrepov za poplavno varnost v obdobju 2007–2012

- ocenjena škoda na vodni infrastrukturi v obdobju od leta 2007 do leta 2012 znaša 424 milijonov evrov. Za sanacijska dela, redno vzdrževanje in nove investicije je bilo v tem obdobju porabljeno 174 milijonov evrov (brez investicij na spodnji Savi);
- sredstva so se večinsko namenjala za sanacijske ukrepe in za podporne investicije pri gradnji HE na spodnji Savi, manj pa za redno vzdrževanje;



- za sanacijske programe 93 milijonov evrov (36 odstotkov)
- za vodno in drugo infrastrukturo na območju HE spodnja Sava 86 milijonov evrov (33 odstotkov)
- za redno vzdrževanje 49 milijonov evrov (19 odstotkov)
- za nove investicije in investicijsko vzdrževanje 31 milijonov evrov (12 odstotkov)

- ministristvo za večino območij pomembnega vpliva poplav še ni določilo ukrepov in tako tudi ni evidentiralo lokacij, ki bi bile namenjene naravnemu ali umetnemu zadrževanju voda. Posledično lokacije še niso zaščitene s prostorskimi akti in se posegi v prostor na takšnih območjih še ne preprečujejo.

www.rs-rs.si 6

Zahtevano odzivno poročilo

Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo, da izdela:

- načrt aktivnosti za spremembo predpisov z namenom **doseči usklajenost in jasnost pojmov** ter določil, ki se nanašajo na poplavna območja in območja ogrožena zaradi poplav;
- načrt aktivnosti, v katerem naj opredeli, kako in do kdaj bo doseglo **zavarovanje pomembnejših območij**, ki bi bila namenjena zadrževanju voda;
- terminski in organizacijski načrt priprave in izvedbe tistih projektov, ki jih namerava realizirati z evropskimi sredstvi programskega obdobja 2014–2020.

Računsko sodišče je od ministrstva in agencije zahtevalo, da izdelata:

- načrt **uskladitve mreže merilni postaj** projekta BOBER z območji pomembnega vpliva poplav.
